




Geförderter Breitbandausbau im Rhein-Sieg-Kreis Troisdorf

Agenda

- 01** Projekt Rhein Sieg Kreis, Troisdorf – Zahlen Daten Fakten
- 02** Aktueller Status
- 03** Verzögerung
- 04** Lösung

Projektübersicht Rhein Sieg Kreis – Troisdorf

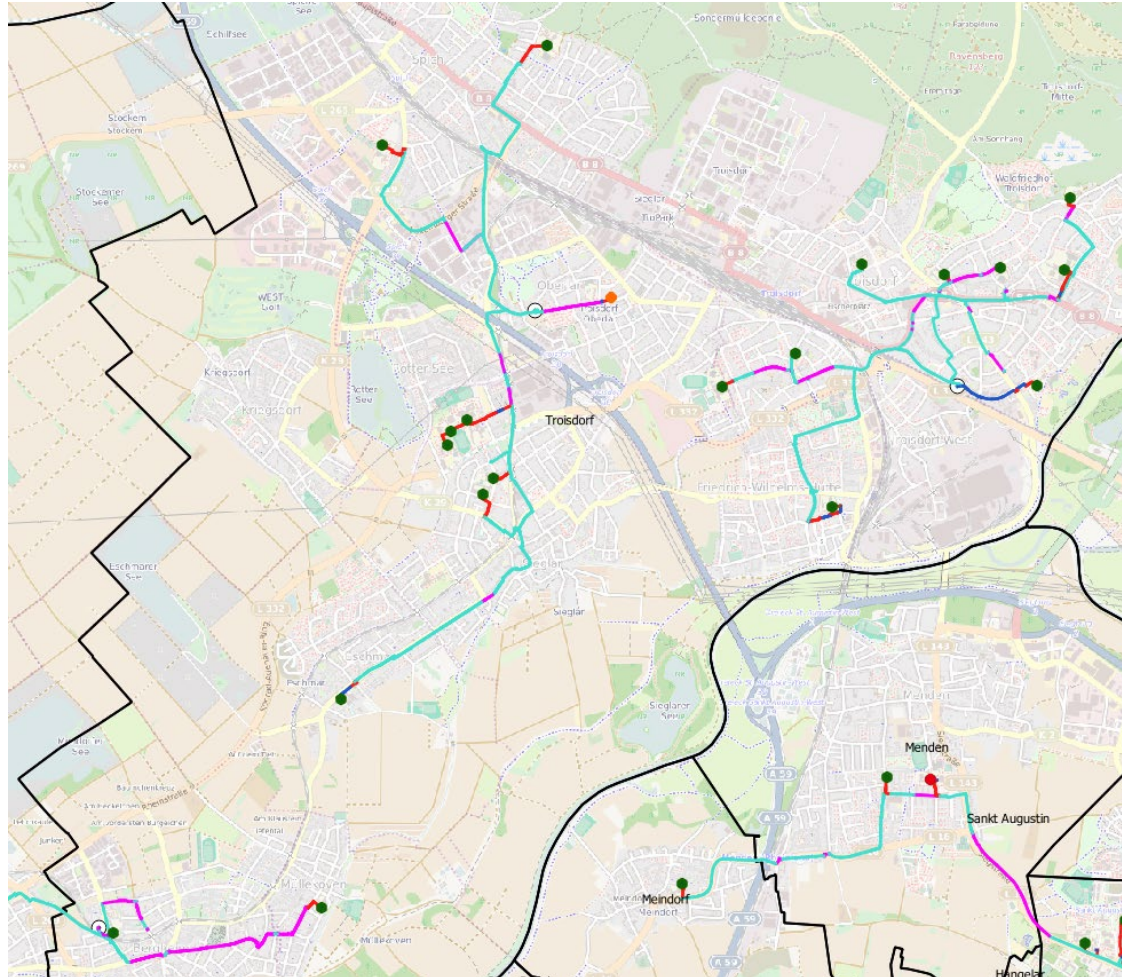

Troisdorf ausschließlich mit Schulen im Projekt

- 2 Vorwahlbereichen
 - 2 Bauabschnitten mit
 - ca. 2 km Tiefbau
 - plus Tiefbau auf den Grundstücken
-
- **Bauabschnitt 02241**
 - 18 Schulen – Ausbau mit FTTH
 - **Bauabschnitt 0228**
 - 2 Schulen mit FTTH

wo stehen wir in Troisdorf



Schulen
Troisdorf
exemplarisch



Für beide Vorwahlbereiche

- Feinplanung an ausführende Firmen übergeben
- Einreichung der Genehmigungsunterlagen zum Sommer
- Hoher Anteil an Bestandstrassen, daher wenig Tiefbau
- Buchbarkeit geplant Ende 2021
- Prioritäten bei den Schulen nehmen wir gerne zur Kenntnis und versuchen diese zu berücksichtigen

Verzögerung im Gesamtprojekt wieso ??



- Erste Bauabschnitte /Schulen unproblematisch
- Beginn 2020 Auftragnehmer Probleme durch Corona
 - Baukolonnen wg. Lockdown abgezogen
- dann mangelnde Bauleistung der Firmen auf Grund von Schwierigkeiten im Genehmigungsprozess Standort und Wegesicherung
 - Unklarheiten bei der Bedienung des Genehmigungsprozesses
 - Fehlerhafte Anträge unseres Auftragnehmers
- Termin zur Klärung mit Landrat Schuster und Telekom am 19.11.2020

zur Verbesserung führt ...



Ergebnis Termin Landrat Hr. Schuster/Telekom

- Austausch Auftragnehmer Telekom
- Benennung eines Ansprechpartners auf Seiten RSK zur Koordination Genehmigung
 - Wenn die bereits eingetretenen Verbesserungen Bestand haben, ist eine Fertigstellung Beginn Q1 2022 möglich

Außerdem:

- Einsatz 2 weiterer Firmen im Projekt
- 60% der Schulen werden wie geplant fertig sein
- Bei den Genehmigungsverfahren der Kommunen mit eigenen Ämtern -> Unterlagen forciert einreichen
- Dialog über Priorisierung weiterführen

Fragen?

BACKUP
